



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

## ÚDAJE O PROJEKTU

### **NÁZEV:**

„Rekonstrukce rybníka: VD 02 v k. ú. Malé Dvorce“

### **HLAVNÍ CÍL:**

**Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení**

Stávající rybník VD 02 byl v nevyhovujícím stavu – zanesený sedimentem s poškozeným opevněním svahů. Rovněž z hlediska protipovodňové ochrany sídla kapacitně a technicky nevyhovoval požerák. Vzhledem k uvedeným špatným funkčním parametrům byl stávající rybník navržen k rekonstrukci. Cílem projektu bylo zlepšit technický stav objektu – odtěžení sedimentu, vybudování nového požeráku a bezpečnostního přelivu pro odvedení významnějších průtoků až na kapacitu Q100. Pro plnou funkčnost bude nutno dobudovat navazující zkapacitnění kanalizace. Cílem bylo taktéž dotvoření krajinného prvku a zvýšení ekologické stability krajiny.

**REGISTRAČNÍ ČÍSLO:** 17/000/0431b/232/000001

**ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE:** Státní pozemkový úřad - Pobočka Tachov

**ZÁMĚR:** b) Realizace plánů společných zařízení

**ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:** NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

**DODAVATEL:** ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

**MÍSTO REALIZACE:** Okres Tachov, Obec Přimda, katastrální území Malé Dvorce

**CELKOVÉ VÝDAJE:** 2 248 135,00 Kč s DPH

**VÝDAJE PRO DOTACI:** 2 243 295,00 Kč s DPH

**PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:** 09. 01. 2017

**UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE:** 21. 09.2017

**TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE:** 15. 09. 2017

### **ANOTACE, POPIS:**

Rybník VD 02 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malé Dvorce. Rekonstrukce rybníka VD 02 je realizována na pozemcích p. č. 946, p. č. 898, st. p. č. 46, st. p. č. 45 v k. ú. Malé Dvorce v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Rybník leží na

severním okraji obce, mezi silnicí III/1978 a polní cestou H 01, jejíž rekonstrukce je rovněž realizací plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Malé Dvorce (dokončena v roce 2016).

S vlastní realizací projektu se započalo v květnu roku 2017, práce byly ukončeny v září roku 2017. Byl odtěžen rybníční sediment, vybudováno koryto ve dně nádrže pro odvod vody od ústí k požeráku, opraven nátok do rybníka a opevnění břehů hráze, vybudován nový kapacitní požerák a schody do zátopy; byla osazena vodočetná lať. Rybník získal parametry zajišťující dostatečnou protipovodňovou ochranu sídla k odvedení běžných i významnějších průtoků (až na kapacitu Q100). Pro plnou funkčnost bezpečnostního přelivu, který je v současnosti sveden do stávající šachty za hrází, bude následně nutné provést zkapacitnění kanalizačního potrubí.


Realizací byl dotvořen krajinný prvek zvyšující ekologickou stabilitu krajiny, její biologickou rozmanitost a funkční využití zájmového území.

## **FOTODOKUMENTACE**

### **STAV PŘED REALIZACÍ:**



### **STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:**

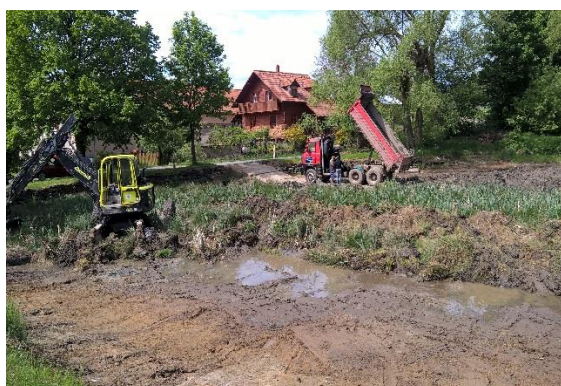

### **STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:**

